



Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

Ofício nº 121/2023 - GP

Jacareí, 30 de março de 2023.

À Vossa Excelência o Senhor
Presidente Abner Rodrigues de Moraes Rosa
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Jacareí

Assunto: **Pedido de Informação nº 42/2023**

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
PROCOLO GERAL Nº <u>328</u>
DATA <u>10 / 04 / 20 23</u>
 FUNCIONÁRIO

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atendimento ao Ofício nº 106/2023-CMJ, dessa Casa Legislativa, datado de 23 de março de 2023, recebido nesta Prefeitura no dia 24 de março de 2023, referente ao Pedido de Informações nº 42/2023, de autoria do vereador Hernani Barreto, venho prestar as seguintes informações:

1. Por qual motivo o prazo dos contratos das mencionadas obras está em atraso? Favor detalhar.

R. A Secretaria de Governo e Planejamento esclarece que, em relação ao prazo de execução do contrato referente às obras de duplicação da Av. Presidente Alencar Humberto Castelo Branco, o mesmo precisou ser aditado em razão de fatores externos que geraram atrasos e demandaram ajustamento do cronograma inicialmente estimado. Entre eles, estão a demora na emissão de autorizações ambientais pela CETESB, a judicialização de processos de desapropriação, além de interferências encontradas no terreno, como tubulações da Comgás e do SAAE, as quais demandaram projetos e serviços complementares. Destaque-se ainda a indisponibilidade de massa asfáltica no mercado durante o ano de 2022, o que também contribuiu para o atraso nos trabalhos.



Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

2. O que exatamente falta para conclusão da duplicação da Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco? Favor detalhar e informar prazo final dos trabalhos.

R. Os elementos faltantes para a conclusão da obra são: acabamento asfáltico; instalação de guias e sarjetas; tratamento do subleito do pavimento; execução de pavimento asfáltico; execução de passeios e ciclofaixa; adequação da iluminação existente e instalação de novos postes e iluminação viária; sinalização horizontal da via (pintura das faixas de rolamentos, faixa de pedestre, ciclovia, pontos de ônibus, entre outros) e sinalização vertical (placas de sinalização); execução do paisagismo em toda a extensão da via (plantio de gramas e mudas de árvores); prolongamento e adequação de manilhas de drenagem pluvial; remanejamento de postes da concessionária EDP.

O novo prazo para entrega da obra, considerados todos os elementos acima listados, é agosto de 2023.

3. Há, no cronograma dessa Administração Municipal, através das secretarias competentes, execução de serviços de manutenção, limpeza e capina na mencionada avenida e vias adjacentes, objetivando amenizar, por hora, os impactos da referida obra? Favor detalhar as atividades com os referidos prazos.

R. Conforme informado pela Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, no mês de janeiro foram executados os serviços de capina e limpeza na avenida mencionada, seguem fotos anexas. Todavia, o local passa por obras que dificulta sua manutenção em razão do elevado fluxo de veículos. Dessa forma, o cronograma de execução de serviços será readequado para ser compatível com as máquinas que estão operando e para preservar a integridade das pessoas que estão trabalhando.

Respeitosamente,



IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí




JULIANA PINHEIRO DUALIBI
Chefe de Gabinete



Prefeitura de Jacareí
Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana

Evidencias fotográficas da capina, limpeza, retirada de lixo e entulho
Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco

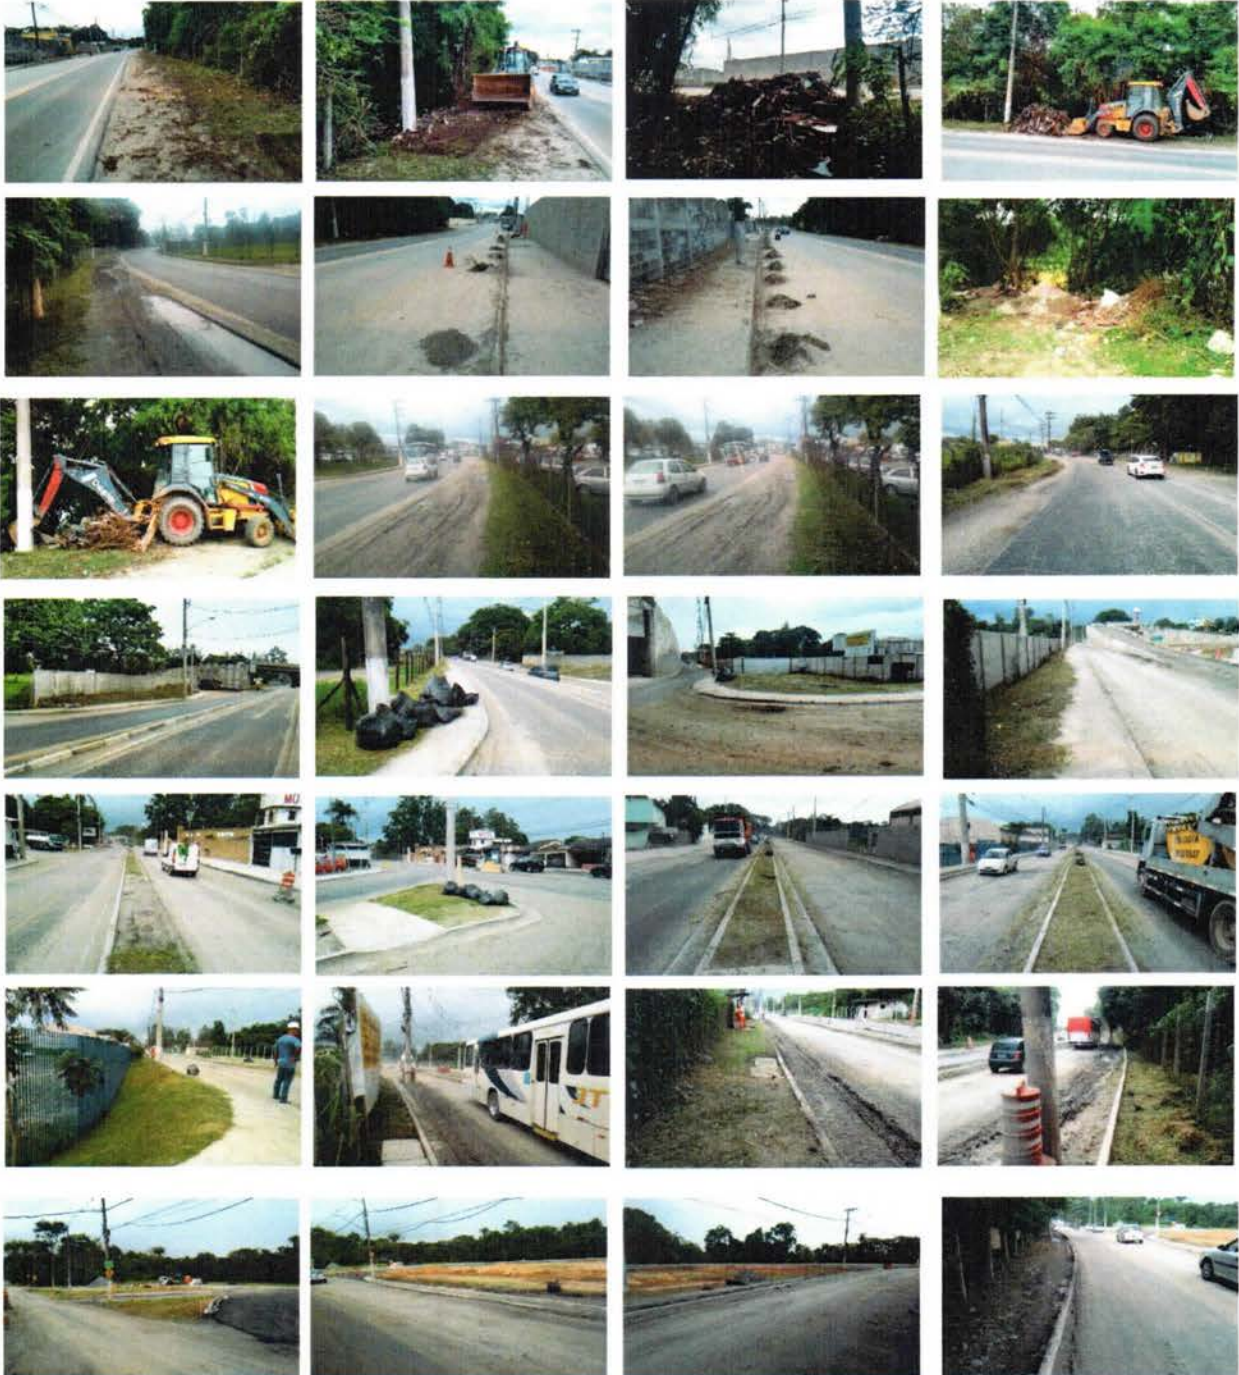



Prefeitura de Jacareí
Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana

Evidencias fotográficas da capina, limpeza, retirada de lixo e entulho
Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco

