

Gestão 2025 – 2028


SAAE Jacareí

Dados, planejamentos e obras



Água

- › Aproximadamente **99%** da população do município com rede de água.
- › Restante é atendido em zona rural com caminhão-pipa devido à distância da região urbana.
- › A cidade possui um total de **90.859 ligações de água.**
- › Produzimos uma média mensal de **2,2 milhões de metros cúbicos** de água tratada.

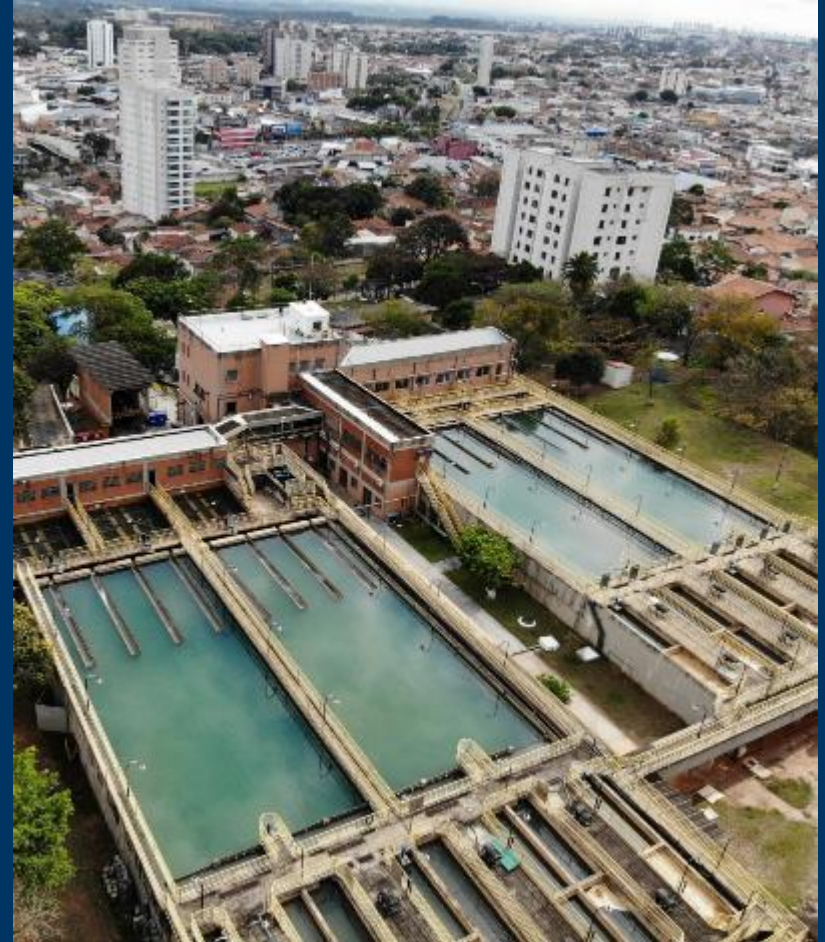

Saneamento

- › 54 Estações Elevatórias de Esgoto;
- › 14 Estações de Tratamento de Esgoto;
- › 92% de esgoto coletado*;
- › 90,82% de tratamento.

*dados estimados pelo SAAE em 2024



Saneamento

Marco legal do saneamento com 9 anos de antecedência.



Obras em andamento



Elaboração de projeto executivo e execução de segundo reservatório de 750 metros cúbicos para centro de distribuição EEA Diogo Fontes

Objetivo: Reforçar a infraestrutura de abastecimento de água, garantindo a regularidade, segurança e eficiência do fornecimento às áreas atendidas por este sistema.

Prazo: Ago/2025

Valor Investido: R\$ 1.615.500,00

Bairros Atendidos: Ygarapés; Pedramar; Imperial; Nova Jacareí; Veraneio Ijal; Nova Esperança; Lago Dourado.

Empresa Contratada: Thesys Engenharia e Saneamento



Recuperação estrutural, impermeabilização, substituição dos blocos drenantes, das camadas suportes e dos elementos filtrantes, e instalação de sistema de espera em aço inox para incorporação de ar na lavagem dos filtros da estação de tratamento de água central.

Objetivo: Melhorar a produção e a qualidade da água tratada.

Prazo: Ago/2025

Valor Investido: R\$ 2.917.612,63.

Bairros Atendidos: Tod.

Empresa Contratada: Petranova Saneamento e Construções Ltda



Execução do esgotamento sanitário no bairro Porto Velho

Objetivo: Implantação de redes de esgoto e de 4 estações elevatórias para proporcionar melhorias significativas na infraestrutura de saneamento básico, promovendo a saúde pública, a qualidade de vida dos moradores e a preservação ambiental.

Prazo: Dez/2025

Valor Investido: R\$ 5.670.705,96

Bairros Atendidos: Porto Velho (cerca de 680 moradores)

Empresa Contratada: Cometa Engenharia

Estimativa de incremento do índice de tratamento de esgoto: 0,28%



Execução do Sistema de Drenagem Urbana do Bairro Jardim Jacinto

Objetivo: Melhorar a drenagem das águas pluviais no Bairro Jardim Jacinto.

Prazo de Conclusão: Agosto de 2025 (previsão de aditamento para Dezembro de 2025)

Valor Investido: R\$ 5.174.999,89

Empresa Contratada: CEPAVI Engenharia

Bairros Atendidos: Jardim Jacinto



Execução de estação elevatória em sistema de abastecimento de água (Booster), no bairro Santa Cruz dos Lázaros

Objetivo: Garantir a distribuição eficiente da água tratada até o sistema de reservatórios da Diogo Fontes, assegurando o abastecimento contínuo e adequado às áreas atendidas por esse sistema.

Prazo: Finalizada - Aguardando apenas ligação de energia por parte da EDP.


Valor Investido: R\$ 1.850.000,00

Bairros Atendidos: Ygarapés; Pedramar; Imperial; Nova Jacareí; Veraneio Ijal; Nova Esperança; Lago Dourado. (cerca de 45 mil pessoas beneficiadas)

Empresa Contratada: Target Engenharia Civil e Elétrica



Obras finalizadas

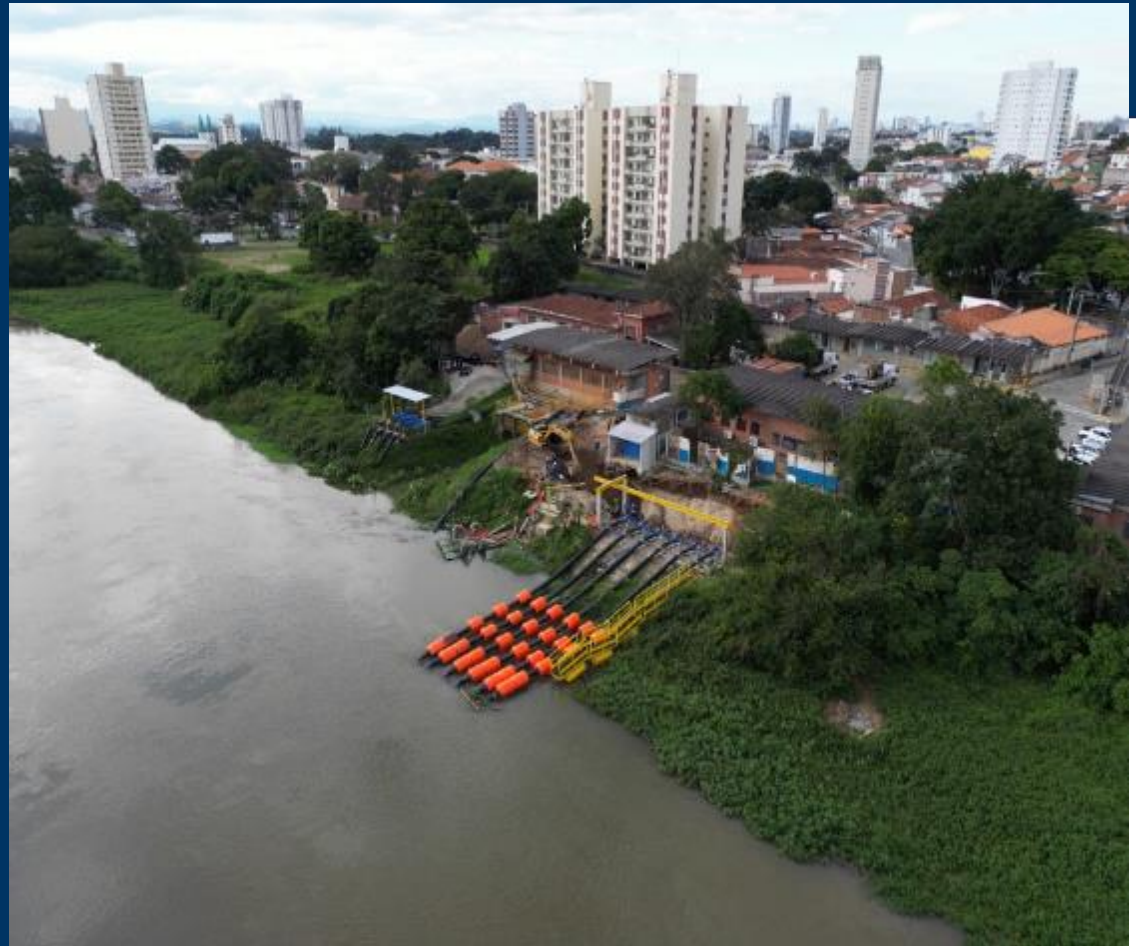

Implantação de rede de distribuição e estação elevatória de água no bairro Jardim Olympia

Jacareí
Todo dia, um novo avanço

saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacareí-SP

Objetivo: Garantir a distribuição eficiente da água tratada até o sistema do Jd. Olympia, assegurando o abastecimento contínuo e adequado às ruas atendidas por esse sistema.

Prazo: Fev/2025

Valor Investido: R\$ 289.099,83

Bairros Atendidos: Jd. Olympia

Empresa Contratada: Cometa Engenharia



Implantação de sistema flutuante de captação de água bruta na Estação de Captação de Água Central

Objetivo: Fornecer uma solução alternativa e eficiente para garantir o abastecimento de água, especialmente em situações de emergência ou condições adversas no sistema de captação de água no Rio Paraíba

Finalizado em 17/06/2025

Valor Investido: R\$ 4.334.427,01

Bairros Atendidos: Todo o município.

Empresa Contratada: Catui Engenharia



Projetos em licitação

Recursos próprios, recursos captados e
recursos de financiamento



[illegible]

Recursos Próprios

Rede de Esgoto Complementar Ygarapés e Veraneio Ijal

Coletar e encaminhar o esgoto para tratamento dos bairros Veraneio Ijal e Chácaras Ygarapés (complementar).

Custo Estimado R\$ 6.156.419,57
Prazo: 6 meses

Licitação agendada para
03/07/25

Estimativa de incremento do índice de
tratamento de esgoto: 0,46%



Recursos Captados

Rede de esgoto complementar do Jd. Pedramar

Possibilitar a coleta de esgoto de imóveis em soleira negativa do bairro Jd. Pedramar.

R\$ 286.467,46 (AGEVAP)

R\$ 1.010.851,52 (SAAE)

Total: R\$ 1.297.318,98

Licitação agendada para 26/06/25

Estimativa de incremento do índice de tratamento de esgoto: 0,08%



Recursos Captados

Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto Ygarapés

Possibilitar o tratamento de esgoto dos bairros Veraneio Ijal e Chácaras Ygarapés (complementar).

R\$ 1.869.694,13 (AGEVAP)
R\$ 4.308.795,10 (SAAE/FINISA)
Total: R\$ 6.178.489,23

Montagem de pasta para licitação.

Estimativa de incremento do índice de tratamento de esgoto: 0,46%



ETE YGARAPÉS - Imagem meramente ilustrativa após ampliação

Recursos Captados

Rede Coletora e Coletor Tronco de Esgoto Avenida Orlando Hardt

Ampliar área de Estudo e coletar e encaminhar para tratamento o esgoto contribuinte à bacia da Av. Orlando Hardt, eliminando descartes irregulares.

Custo Estimado R\$ 2.534.438,78 (90% recursos Fehidro e 10% recursos próprios)
Prazo: 9 meses

Em montagem da Pasta de Licitação.

População Beneficiada: 6.334 pessoas.



Recursos Captados

Novo Coletor de Esgoto da Rua Pedro Guery

Eliminar o extravasamento de esgoto na Rua Pedro Guery em época de chuvas.

R\$ 2.193.135,64 (AGEVAP)
R\$ 1.462.157,092 (SAAE)
Total: R\$ 3.655.292,73

Status: Aguardando ultima análise da AGEVAP para liberar processo licitatório.



Recursos Parcialmente Captados

ETA III e Retrofit das ETAs I e II

O município de Jacareí, possui duas Estações de Tratamento de Água, denominadas ETA I e ETA II, com captação de água bruta através de manancial sendo este o Rio Paraíba do Sul, localizadas na região central do município.

Essas duas ETAs são responsáveis pelo abastecimento de água de 95% do município, sendo que o município conta ainda com uma ETA denominada ETA São Silvestre, com captação de água bruta através do Rio Paraíba do Sul, que abastece 0,02% e as denominadas Unidades de Contribuição cuja captação de água bruta é realizada através de poços profundos e mananciais provenientes de represa, responsáveis por abastecer 3,98%.

Recursos Parcialmente Captados

A ETA I, implantada em 1963, passou por ampliação e modernização entre 1988 e 1990, quando foi implantada também a ETA II, aumentando a capacidade de 330 L/s para 980 L/s. No entanto, a crescente demanda e a necessidade de continuidade dos serviços exigem a ampliação e modernização das ETAs I e II, bem como a implantação da ETA III, o que elevará a capacidade total de 980 L/s para 1.700 L/s.

R\$ 17.365.757,78 (Novo PAC)
R\$ 33.000.000,00 (Contrapartida SAAE)
Total: R\$ 50.365.757,78

Status: Aguardando assinatura do contrato do Novo PAC e em busca de novo financiamento para contrapartida.

ETA III e Retrofit das ETAs I e II

ETA CENTRAL - Módulo I e II



ETA CENTRAL - Imagem meramente ilustrativa após ampliação do módulo III



Recursos de financiamento

Reservatório de 2500 m³ Jardim Paraíso

Aumentar a capacidade de
reservação do Sistema Jd. Paraíso

Valor estimado R\$ 8 milhões

Status: Em elaboração de Projeto
Básico.



Reservatório 2.500 m³ Jd. Paraíso - Imagem meramente ilustrativa

FINISA

(Financiamento à
Infraestrutura e ao
Saneamento)



OBRAS CONCLUÍDAS

PRAZO DE EXECUÇÃO	OBJETO	TIPO	INÍCIO PREV	TÉRMO PREV	INAUGURAÇÃO PREVISTA	VALOR DO CONTRATO
240 DIAS	ETE Ygarapés	ESGOTO	fev/23	mar/24	set/24	R\$ 5.318.017,90
240 DIAS	Veraneio Irajá	ÁGUA	jan/23	mar/24	mar/24	R\$ 1.364.028,78
90 DIAS	Rua Nazur e Rua Dalva	ESGOTO	jan/23	abr/23	abr/24	R\$ 272.969,58
270 DIAS	Troca de Rede Jardim Jacinto	PERDAS	abr/23	jun/24	jun/24	R\$ 1.320.809,68
300 DIAS	Jardim Emília e Vila Ita	ESGOTO	mai/23	mai/24	jun/24	R\$ 2.402.366,44
150 DIAS	Reforma filtro 05B - ETA Central	DTAE	set/23	fev/24	fev/24	R\$ 656.425,03
120 DIAS	Booster Jd. Olympia	ÁGUA	out/23	mai/24	mai/24	R\$ 301.909,96
120 DIAS	EEA Santa Cruz dos Lazáros	ÁGUA	set/24	fev/25	fev/25	R\$ 1.850.000,00

R\$ 13.486.527,37

PROJETOS CONCLUÍDOS

90 DIAS	Rede Jd. Pedramar	ESGOTO	set/23	abr/24	FINALIZADA	R\$	161.726,31
90 DIAS	Coletor Orlando Hardt	ESGOTO	jul/23	out/23	FINALIZADA	R\$	50.350,48
120 DIAS	Rede Rua Pedro Guery	ESGOTO	jul/23	abr/24	FINALIZADA	R\$	240.239,83
90 DIAS	Esgoto Complementar Chác. Ygarapés + Ijal (Finalização Fase 01 e Fase 02)	ESGOTO	ago/23	jun/24	FINALIZADA	R\$	231.943,55
30 DIAS	By-Pass ETE Central	ESGOTO	ago/23	set/23	FINALIZADA	R\$	18.755,02

R\$ 703.015,19

OBRAS EM ANDAMENTO

PRAZO DE EXECUÇÃO	OBJETO	TIPO	INÍCIO PREV	TÉRMO PREV	INAUGURAÇÃO PREVISTA	VALOR DO CONTRATO
365 DIAS	Estância Porto Velho (FINISA+AGEVAP)	ESGOTO	out/23	out/24	fev/26	R\$ 2.530.289,94
120 DIAS	Sistema Flutuante de Captação de água bruta na estação de captação central	ÁGUA	nov/24	abr/25	abr/25	R\$ 4.009.003,78
120 DIAS	Serviço de Recuperação Estrutural, impermeabilização, substituição dos blocos drenantes, das camadas suportes	ÁGUA	nov/24	ago/25	ago/25	R\$ 2.390.000,00

R\$ 8.929.293,72

PROJETOS EM ANDAMENTO

PRAZO DE EXECUÇÃO	OBJETO	TIPO	INÍCIO PREV	TÉRMO PREV	EVOLUÇÃO
60 DIAS	Rede Coletora, ajustes EEE e em Linhas de Recalque ETE Santa Paula	ESGOTO	jul/25	set/23	A INICIAR

R\$ 95.044,28

OBRAS A LICITAR

OBJETO	TIPO	INÍCIO PREV	TÉRMO PREV
Ampliação ETE Ygarapés (Contrapartida)		set/25	jan/26

R\$ 3.011.473,72

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

OBJETO	EMPRESA	STATUS
BOMBA CENTRÍFUGA (01)UNID. CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA - CONTRATO Nº 107/2023.	IMBIL INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA	ENTREGUE
BOMBA CENTRÍFUGA (01)UNID. CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA - CONTRATO Nº 107/2023.	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	ENTREGUE
MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL PARA RECALQUE DE ESGOTO BRUTO 01 UNID.	HT COMERCIO DE MAQUINAS DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ENTREGUE
MOTOBOMBA (02)UNID. SUBMERSÍVEL PARA RECALQUE DE ESGOTO BRUTO-CONTRATO Nº 207/2023.	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA	ENTREGUE
CONJUNTO MOTOBOMBA (01)UNID.	KSB BRASIL LTDA	ENTREGUE
MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL (03)UND.	BOMBEMI COMERCIAL LTDA ME	ENTREGUE
MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL (03)UND.	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	ENTREGUE
MOTOBOMBA (01)PC E MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL (08)UNID.	WKL COMERCIAL DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ENTREGUE

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL (01)UND.	HT COMERCIO DE MAQUINAS DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ENTREGUE
MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL (02)UND.	BH20 BOMBAS E SERVICOS COM. E REPRESENTACOES LTDA	ENTREGUE
MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL (03)UND.	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA	ENTREGUE
CLASSIFICADOR DE AREIA (02)UNID.	GWA WATER SISTEMAS E EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA.	ENTREGUE
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO (01)UNID.	ESA - ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA	ENTREGUE
CONJUNTO MOTOBOMBA (03)UNID.	CCS COMERCIO SERVICOS E LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ENTREGUE
CONJUNTO MOTOBOMBA (02) UNID EEE ARBOVILLE	MÉRITO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	ENTREGUE
GERADOR A DIESEL (01)UND. EEE	GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA	ENTREGUE
STORAGE (01) DATA CENTER DO SAAE JACAREÍ	SK TECNOLOGIA LTDA	ENTREGUE
BOMBA CENTRÍFUGA (02)PC- BOOSTER PARQUE IMPERIAL	KSB BRASIL LTDA	ENTREGUE
BOMBA CENTRÍFUGA (01) BOOSTER NOVA JACAREÍ	KSB BRASIL LTDA	ENTREGUE

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

ANALISADOR DE ENERGIA ELÉTRICA (09)UND.	EMBRASUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.	ENTREGUE
GERADOR A DIESEL, CARENADO E SILENCIOSO	EMBALEPACK INDUSTRIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	ENTREGUE
02 GEOFONES ELETRÔNICOS; DETECTOR DE VAZAMENTOS; MÍNIMO DE 50 COMBINAÇÕES DE FILTRO	GODANT VAREJISTA LTDA	ENTREGUE
CONJUNTO DE MOTOBOMBA CENTRÍFUGA PARA EEA SANTA TEREZINHA	CE DISTRIBUIDORA DE BOMBAS LTDA - PREGÃO ELETRÔNICO 091/2024	ENTREGUE
MOTOBOMBA DE DRENAGEM SUBMERSÍVEL PARA DESAGUAMENTO DE VALAS	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	ENTREGUE
GRUPO MOTO GERADOR DIESEL CARENADO E SILENCIOSO A 750KVA (600KW) E POTENCIA PRIME DE 688 KVA (550KW) - USO: UNIDADE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - PREGÃO ELETRÔNICO 091/2024	GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA.	ENTREGUE
TRANSFORMADOR A ÓLEO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA	TELECON COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	ENTREGUE
MOTOBOMBA CENTRÍFUGA (01)PC PARA RECALQUE DE ÁGUA	IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMBAS LTDA	ENTREGUE

R\$

3.774.645,72

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS	R\$	3.774.645,72
ÁGUA	R\$	10.730.581,33
ESGOTO	R\$	14.173.963,28
PERDAS	R\$	1.320.809,68
TOTAL	R\$	30.000.000,00

Paradas programadas

Janeiro – Maio
2025



Desde janeiro de 2025, o SAAE Jacareí efetuou 11 paradas programadas que visam a manutenção e melhoria dos equipamentos na Estação de Captação de Água (ECA) e na Estação de Tratamento de Água (ETA).

Todas as paradas foram devidamente divulgadas aos munícipes por meio das nossas redes sociais, além dos canais oficiais de comunicação da cidade.



Janeiro

09 – retirada para manutenção da chave de comutação da bomba 2 da ECA

14 - instalação de raquete para a vedação do filtro na ETA

28 – substituição de válvulas na ETA



Motobomba antiga (1992)



Motobomba nova (2025)

Fevereiro

20- substituição de válvula tipo gaveta da retrolavagem e interligação do Booster Santa Cruz dos Lázaros



Válvula antiga



Válvula atual

Março

11- instalação de raquete para vedação do filtro 01 da ETA Central e manutenção na bomba de distribuição do reservatório Santa Terezinha



Abril

23- troca de bomba 1 da ECA

30 – instalação de ponto de descarga em rede 50 mm na Estrada Municipal do Jardim, no bairro Jardim Colônia



Troca da bomba 1 ECA

Maio

14 – ligação de cabeamento para o transformador 220v na ECA

21 – energização do transformador 220v da ECA, retirada do transformador locado, substituição da bomba 1 na ECA, substituição do colar de tomada na linha da bomba ETA x Santa Terezinha

23 – instalação de ponto de descarga 50mm na rua dos Canários

29 – instalação do sistema de fixação das bombas Higrá, instalação da raquete de vedação do filtro 3 e substituição da válvula 350mm



Tubos de queda de linha de recalque antigos



Tubos de queda de linha de recalque atuais

Indicadores SINISA (Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico)

Ano de referência 2024



Planejamento 2025 - 2028



Objetivo

O planejamento da gestão do SAAE Jacareí nos próximos 4 anos, demonstrando o panorama atual, as metas a curto, médio e longo prazo e as obras previstas.

Abastecimento Urbano

98,41%

Coleta de Esgoto Urbana

92,65%

Tratamento Urbano

90,76%*

Índices oficiais 2023 com base a nova metodologia do SINISA.

**Índice de tratamento de esgoto estimado para 2024 devido a inauguração da ETE Ygarapés.*

Planejamento Biênio 2025 - 2026

Obras a serem entregues

- 1- Captação auxiliar flutuante
- 2- Reforma dos filtros da ETA
- 3- Drenagem Jardim Jacinto
- 4- Duplicação reservatório Diogo Fontes
- 5- Rede de esgoto êstancia Porto Velho
- 6- Nova adutora região leste
- 7- Esgoto Veraneio Ijal

- 8- Novo coletor rua Pedro Guery
- 9- Rede auxiliar Jardim Pedramar
- 10- Coletor de esgoto Orlando Hardt
- 11- Ampliação ETE Ygarapés
- 12- Rede complementar Rio Comprido
- 13- Esgoto complementar Ygarapés

91,91%
Tratamento de Esgoto

Planejamento Biênio 2027-2028

Obras/Projetos a serem entregues

1- ETA III e Retrofit das ETAS I e II

2- Macromedição da ETA

3- Tratamento de esgoto
bacia 6 (Jardim Flórida, Jardim
Emília e Jardim Marister)

4- Rede de esgoto Chácaras
Guararema


5- Esgotamento sanitário nos
bairros Cid. Jardim, Dindinha e
parte baixa do Jd. Panomara

6- Elaboração do plano de
perdas para a região oeste

7- EEE Cepinho

94,67%
Tratamento de Esgoto

LINHA DO TEMPO - META 100% GESTÃO 2025 - 2028

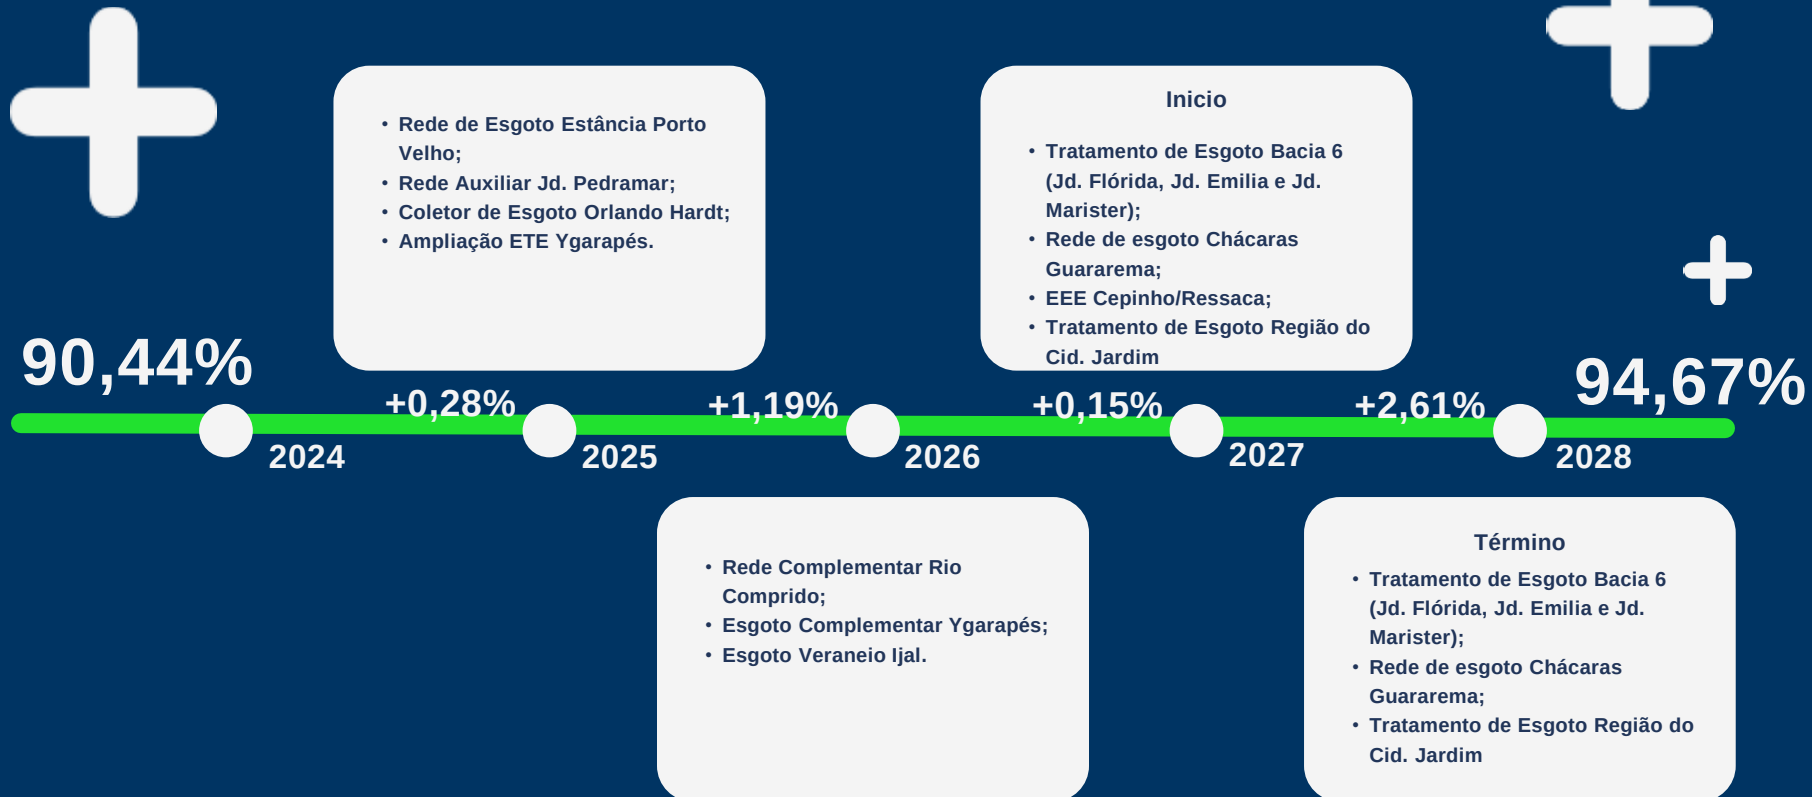

Plano de Governo – prefeito Celso Florêncio e vice Edgard Sasaki

2025 - 2028



Universalização do Tratamento de Esgoto: Garantir que todo o esgoto seja tratado adequadamente no município.

b) Distribuição de Água Potável: Ampliar e aprimorar o sistema de distribuição de água potável para garantir segurança hídrica e reduzir ocorrências de oscilação de fornecimento, além de promover um controle efetivo e a redução do índice de perdas de água.

e) Ampliação da Estação de Captação Central: Implantar flutuante na estação de captação central.

0) Esgotamento Sanitário no Bairro Estância Porto Velho: Implantação de sistema de esgotamento sanitário.

0) Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto Ygarapés: Atender Bairro Veraneio Ijal.

Rede de Drenagem no Bairro Jardim Jacinto: Implantar sistema de drenagem.

O saneamento básico é um pilar fundamental para a saúde pública e a qualidade de vida em qualquer cidade. Em Jacaré, não é diferente: a garantia de serviços adequados de água potável, coleta e tratamento de esgoto é crucial para a promoção do bem-estar das nossas comunidades e a preservação do meio ambiente. Um sistema de saneamento eficiente não só melhora as condições de saúde, prevenindo doenças e promovendo a higiene, mas também contribui para o desenvolvimento sustentável e a valorização do cidade.

saneamento, atingindo, aproximadamente, 80% de cobertura para a coleta de esgoto e 95,0% para o abastecimento de água. Mas ainda pode ser feito muito mais para se comprometer a continuar investindo na expansão e na modernização dos serviços de água e esgoto. Pretendemos implementar novas tecnologias, ampliar a cobertura e garantir a manutenção adequada das instalações existentes. Isso será realizado através das seguintes propostas:

- ii. Universalização do Tratamento de Esgoto: Garantir que todo o esgoto seja tratado adequadamente no município.

Novo Módulo de Tratamento de Água na ETA 3: Implantar o novo módulo na Estação de Tratamento de Água 3.

15. **SANEAMENTO BÁSICO**

O saneamento básico é um pilar fundamental para a saúde pública e a qualidade de vida em qualquer cidade. Em Jacareí, não é diferente: a garantia de serviços adequados de água potável, coleta e tratamento de esgoto é crucial para a promoção do bem-estar das nossas cidadãs e a preservação do meio ambiente. Um sistema de saneamento eficiente não só melhora as condições de saúde, prevenindo doenças e promovendo a higiene, mas também contribui para o desenvolvimento sustentável e a valorização da cidade.

Rede de Esgoto no Bairro Veraneio Ijal: Implantar sistema de esgoto

saneamento, atingindo, aproximadamente, 90% de cobertura para a coleta de esgoto e 95,0% para o abastecimento de água. Uma outra prioridade será fazer mais obras para se comprometer a continuar investindo na expansão e na modernização dos serviços de água e esgoto. Pretendemos implementar novas tecnologias, ampliar a cobertura e garantir a manutenção adequada das instalações existentes. Isso será realizado através das seguintes propostas:

- a) **Universalização do Tratamento de Esgoto:** Garantir que todo o esgoto seja tratado adequadamente no município.

Esgoto Complementar no Bairro Chácaras Reunidas Ygará implantar sistema de esgoto complementar.

O saneamento básico é um pilar fundamental para a saúde pública e a qualidade de vida em qualquer cidade. Em Jacareí, não é diferente: a garantia de serviços adequados de água potável, coleta e tratamento de esgoto é crucial para a promoção do bem-estar das nossas comunidades e a preservação do meio ambiente. Um sistema de saneamento eficiente não só melhora as condições de saúde, prevenindo doenças e promovendo a higiene, mas também contribui para o desenvolvimento sustentável e a valorização do cidade.

Para a coleta de esgoto, serão implantados novos pontos de coleta, melhorando a cobertura e a qualidade do serviço. Pretendemos implementar novas tecnologias, ampliar a cobertura e garantir a manutenção adequada das instalações existentes. Isso será realizado através das seguintes propostas:

- i) Universalização do Tratamento de Esgoto: Garantir que todo o esgoto seja tratado adequadamente no município.

Taponamento de Tanques com Filtros de Odor na ETE do Bairro Parque Imperial: Reduzir odores na estação de tratamento.

Obrigado!

Rua Miguel Leite do Amparo,
121 - Centro – Jacareí

(12) 3954-0300

www.saejacarei.sp.gov.br

Cuidar é a nossa missão!
